

平成28年9月7日

工 事 定 期 監 査 及 び 出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告

危機管理室，環境局，建設局，住宅都市局，みなと総局
水道局，交通局
(公財)神戸市公園緑化協会，(一財)神戸すまいまちづくり公社
阪神国際港湾(株)，(株)OMこうべ，神戸交通振興(株)

神戸市監査委員	谷	口	時	寛
同	吉	田	基	毅
同	岩	田	嘉	晃
同	橋	本		健

地方自治法第199条第1項，第2項，第4項及び第7項の規定に基づき実施した平成28年度第1期工事定期監査及び出資団体工事監査について，同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

目 次

1	監 査 の 対 象	3
2	監 査 の 期 間	3
3	監 査 の 方 法	3
4	主 な 監 査 項 目	3
5	監 査 の 結 果	4

○指摘事項

(1) 重点項目「工事の安全管理」

ア	作業計画に基づく解体作業	5
---	--------------	---

(2) 設 計

ア	排水構造物の設計	6
---	----------	---

イ	土留の設計	6
---	-------	---

(3) 積 算

ア	コンクリート舗装の積算	7
---	-------------	---

イ	仮設足場の単価	7
---	---------	---

ウ	墨出し，養生費，整理清掃費の数量の算出	8
---	---------------------	---

エ	管基礎工の数量の算出	8
---	------------	---

オ	フェンス撤去の単価	9
---	-----------	---

カ	土木工事の諸経費調整	9
---	------------	---

キ	公表価格の査定率	10
---	----------	----

ク	配管工事の施工区分	10
---	-----------	----

(4) 契 約

ア	業務着手の時期	11
---	---------	----

イ	製造その他請負契約約款の徹底	11
---	----------------	----

○抽出状況表他	12
---------	----

1 監査の対象

危機管理室，環境局，建設局，住宅都市局，みなと総局，水道局，交通局，（公財）神戸市公園緑化協会，（一財）神戸すまいまちづくり公社，阪神国際港湾（株），（株）OMこうべ，神戸交通振興（株）における平成 27 年度施行事について監査を行った。

工事の抽出状況は第 1 表，抽出工事は第 2 表のとおりである。

2 監査の期間

平成 28 年 4 月 22 日～平成 28 年 9 月 7 日

3 監査の方法

監査は，土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか，また経済性，効率性，有効性，正確性，安全性及び透明性などの観点から適切に行われているかについて，関係書類の審査，現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

4 主な監査項目

- | | |
|----------|---|
| (1) 計画 | 計画書，事前協議及び諸手続きの状況 |
| (2) 設計 | 関係法規等の適用，設計基準等の整備状況及びその運用
設計図書の整備，設計の照査 |
| (3) 積算 | 積算基準等の整備状況及びその運用，工種・数量・単価・歩掛り等の適用，
積算の照査 |
| (4) 契約 | 契約締結手続き，設計変更等の理由，手続き及び内容 |
| (5) 施工 | 工事関係法規等，施工管理，工事関係書類，監督業務 |
| (6) 検査 | 検査関係書類 |
| (7) 維持管理 | 保守点検関係書類 |
| (8) 委託業務 | 委託業務関係書類 |

5 監査の結果

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正に行われているものと認められた。

重点項目として監査を行った「工事の安全管理」は、市民や工事関係者の安全・安心に直接関わる重要な事項であるが、監督職員への研修やパトロールの強化など、当局の取組みが浸透しつつあり、引き続き安全意識の向上に向け効果的な対策を推進されたい。

一方、設計、積算については、工事の予定価格を設定する基本的な事項であるため、個々の職員のさらなる能力向上に加え、内部における設計積算はもちろん、外部委託による設計積算の成果物等に対しても組織的な照査体制を構築することにより、違算等の防止に努めることが重要である。

また、契約締結前に、業務に着手した事例も見られた。契約の締結は、業務開始にあたって不可欠な手続きであり、法令順守を徹底されたい。

その他、事務の一部について、次のような改善を要する事例があったので、今後、適正な事務処理に努められたい。

○ 指 摘 事 項

(1) 重点項目「工事の安全管理」

ア 作業計画に基づく解体作業

本工事は、須磨区における５階建て市営住宅の解体撤去工事である。

解体作業の作業計画は、労働安全衛生規則に基づき作業手順や危険防止の方法等を記載する必要がある。

今回の解体作業は、東側上空の高圧電線が支障となり、重機のアームの作業範囲に制約があったため、北東角の５階部分を一部残し、４階の一部から先行解体した。

しかし、作業計画では、本来定めるべき作業手順等の具体的な記載がなかった。また、発注者は請負人からその作業計画を受理したが、上記のような制約下での作業にもかかわらず、作業計画の確認が不十分なまま解体作業を進めた。

法令を遵守して適切な作業計画を策定するとともに、作業計画に基づいて発注者、請負人双方が事前に作業手順や安全性を確認し、必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるよう、発注者による安全管理の徹底と請負人への指導を行うべきである。



(住宅都市局住宅部住宅建設課)

[No. 26 水野住宅 1, 2 号棟とりこわし及び敷地整備工事]

(請負金額 41,943 千円)

(2) 設 計

ア 排水構造物の設計

本工事は、西区における中学校のグラウンド整備工事である。

グラウンドの外周に側溝を配置し雨水を処理しているが、グレーチングが極端に少なく、側溝に雨水が円滑に流入しない状態となっていた。また、計画地盤高さから判断すると、雨水の流入が期待できない箇所にも側溝が整備されており、流量計算上も著しく過大な断面となっている箇所もあった。

現場条件を踏まえ、適切に設計・整備すべきである。

(みなと総局技術部工務課)

[No.46 西神住宅第2団地 2-3 工区整備工事]

(請負金額 142,004 千円)

イ 土留の設計

本工事は、垂水区における小学校の敷地整備工事である。

雨水管路の布設においては、掘削にあたり掘削深さや土質条件等を確認したうえで土留型式を選定することになっており、本工事では簡易土留及び鋼矢板を選定していた。

また、土留の構造は設計基準等に基づき掘削深さに応じて安定計算を行い、安全かつ確実に施工できる構造とすることになっている。

しかし、施工計画時の安定計算は、簡易土留は1断面の計算しかなく、掘削深さに応じた安定計算が行われていなかった。また、鋼矢板では掘削深さに応じた安定計算は行われていたものの最小根入長が考慮されていなかったため、最小根入長が確保されていない箇所があった。

土留は設計基準等に基づき適切に設計すべきである。

※根入長：矢板等における掘削深さ以深の矢板長さ

((一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課)

[No.79 (仮称)舞多聞小学校敷地整備工事]

(請負金額 247,050 千円)

(3) 積 算

ア コンクリート舗装の積算

本工事は、北区における公園の造成及び主園路等を整備するものである。

電線管路の防護等を目的としてコンクリート舗装を施工しているが、コンクリートの材料費が計上されておらず、過小となっていた。

積算基準を十分確認し、適切に積算すべきである。



(建設局北建設事務所)

[No.12 しあわせの森整備工事(その4)]

(請負金額 13,719 千円)

イ 仮設足場の単価

本工事は、長田区における市営住宅の新築工事である。

本工事では、コンクリート打設の躯体工事において、外部および内部に仮設足場を設置している。

しかし、内部躯体足場の採用単価について、階高4m以下の単価を採用すべきところを、階高4m超5m未満の単価を誤って採用したため、過大となっていた。

単価の適用条件を十分確認し、適切に積算すべきである。

(住宅都市局住宅部住宅建設課)

[No. 25 (仮称)房王寺住宅 14 号棟建設工事]

(請負金額 896,536 千円)

ウ 墨出し、養生費、整理清掃費の数量の算出

本工事は、長田区における市営住宅の新築工事である。

本工事では、工事中に必要な基準を表示する墨出しや、コンクリート打設などの養生、現場の整理清掃を行っている。

しかし、これらの墨出し、養生費、整理清掃費の延床面積の算出にあたって、公営住宅法に基づき算出すべきところを、誤って建築基準法に基づき算出したため、過小となっていた。

工事積算における数量の算出は、適切に行うべきである。

(住宅都市局住宅部住宅建設課)

[No. 25 (仮称)房王寺住宅 14 号棟建設工事]

(請負金額 896,536 千円)


エ 管基礎工の数量の算出

本工事は、神戸複合産業団地における雨水幹線を築造するものである。

本工事では、雨水幹線の管基礎を水砕スラグで施工しており、管基礎工の積算には砂基礎工を適用している。

砂基礎工の積算では、数量は土量変化率を考慮して計上することになっているが、本工事では、土量変化率を考慮せずに数量を算出していたため、過小となっていた。

工事積算における数量の算出は、適切に行うべきである。

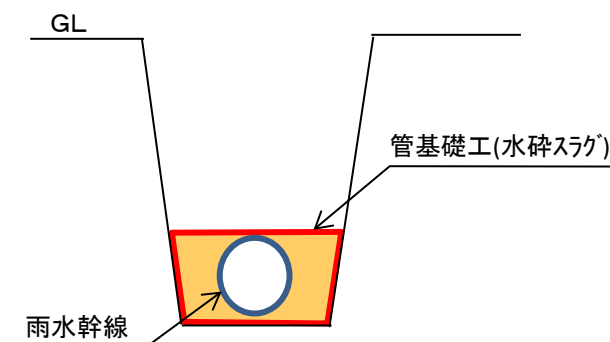

※水砕スラグ：高炉から生成する溶融スラグに多量の圧力水を噴射することにより急冷した砂状のスラグで、土木資材として再利用されている

※土量変化率：土の締固め前後の体積比

(みなと総局技術部工務課)

[No.48 神戸複合産業団地 1 号ダム雨水幹線築造工事(その 6)]

(請負金額 109,684 千円)

オ フェンス撤去の単価

本工事は、中央区にある高等学校の北側道路の交差点改良に伴う道路擁壁を築造する工事である。

擁壁上部には、歩行者の安全確保と目隠しのためのフェンスが設置されているが、フェンス撤去の積算において、単位数量の設定及び計上すべき項目において誤りがあり、過大となっていた。

単価構成を十分確認し、適切に積算すべきである。

((一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課)

[No.78 市道野崎線(葺合高校北側交差点)整備事業における道路擁壁工事]

(請負金額 81,162 千円)

カ 土木工事の諸経費調整

本工事は、中央区にある高等学校の北側道路の交差点改良に伴う道路擁壁を築造する工事であり、同校の敷地整備工事の受注者と随意契約している。

神戸市土木工事標準積算基準書では、新規に発注する工事（以下「後工事」という。）を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合、諸経費は契約済みの工事（以下「前工事」という。）と後工事を一括して発注したとして算定した額から、前工事の額を控除した額と規定されている。

しかし、後工事である本工事においては、諸経費調整を実施しておらず、過大となっていた。積算基準を十分確認し、適切に積算すべきである。

※随意契約する場合の後工事の諸経費 = 一括発注した場合の諸経費 - 前工事の諸経費

((一財)神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課)

[No.78 市道野崎線(葺合高校北側交差点)整備事業における道路擁壁工事]

(請負金額 81,162 千円)

キ 公表価格の査定率

本工事は、兵庫区における高等学校の校舎の新築工事である。

建築工事では、刊行物に掲載されているメーカー等が発表した公表価格を単価として採用する場合は、「神戸市建築工事積算要領」に基づき所定の査定率を適用することとしている。

しかし、本工事では、鉄骨工事の耐火被覆の耐火塗料の積算において、刊行物の公表価格を単価として採用していたが、査定率を乗じていなかったため、過大となっていた。

工事積算における査定率の適用は、適切に行うべきである。

((一財) 神戸すまいまちづくり公社施設整備部都市整備課)

[No. 80 新商業高校建設工事]

(請負金額 3,402,000 千円)

ク 配管工事の施工区分

本工事は、垂水区における小学校新築工事に伴う機械設備工事である。

建築機械設備工事の工事費は、「神戸市建築機械設備設計図書作成要領」並びに、「神戸市公共建築工事積算基準（機械設備工事）」に基づき、適正に積算するとされている。

しかし、本工事では屋内給排水設備の配管工事の施工区分において、屋内一般配管とすべきところを地中配管として積算していたため、過小となっていた。

図面と設計内訳書を十分確認し、適切に積算すべきである。

((一財) 神戸すまいまちづくり公社施設整備部設備課)

[No.88 (仮称) 舞多聞小学校校舎新築機械設備工事]

(請負金額 311,120 千円)

(4) 契 約

ア 業務着手の時期

本業務は、地下鉄海岸線車両の車輪のはめ替え業務である。

地方自治法では、地方公営企業の管理者が締結する契約については、契約者双方が記名押印しなければ、契約が確定しないものとされている。

しかし、本業務では、随意契約が確定する前に業務に着手していた。

業務の着手前には、法令に基づき契約締結の手続きが完了している事を確認すべきである。

(交通局高速鉄道部地下鉄車両課)

[No.72 平成 27 年度 海岸線 5000 形車両車輪はめ替え(その 2)]

(請負金額 10,402 千円)

イ 製造その他請負契約約款の徹底

本業務は、海岸線車両の車輪のはめ替え、および運転状況の記録機能を追加する業務である。

「製造その他請負契約約款」によると、契約の履行に関して、責任者（業務責任者）を選任し、その氏名、連絡先その他必要な事項を書面により通知することとされている。

しかし、本業務では責任者選任の必要性を認識せず、書面による通知もなされていなかった。約款に基づき適正に契約を履行するよう、請負人を指導すべきである。

(交通局高速鉄道部地下鉄車両課)

[No.72 平成 27 年度 海岸線 5000 形車両車輪はめ替え(その 2)]

(請負金額 10,402 千円)

[No.73 平成 27 年度 海岸線 5000 形車両運転状況記録機能追加作業]

(請負金額 32,400 千円)

第 1 表 抽 出 状 況 表

工 事 定 期 監 査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
危 機 管 理 室	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	1	24,084	1	24,084	100.0	100.0
環 境 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	63	25,211,268	7	633,563	11.1	2.5
建 設 局	土 木	155	2,361,577	15	298,711	9.7	12.6
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	—	—	—	—	—	—
住 宅 都 市 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	42	7,976,017	7	2,736,397	16.7	34.3
	設 備	50	1,935,973	7	673,127	14.0	34.8
み な と 総 局	土 木	73	5,661,756	12	2,288,663	16.4	40.4
	建 築	6	487,677	1	83,305	16.7	17.1
	設 備	28	563,111	6	147,542	21.4	26.2
水 道 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	7	599,053	1	11,732	14.3	2.0
	設 備	69	3,360,194	8	354,776	11.6	10.6
交 通 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	18	583,692	1	35,548	5.6	6.1
	設 備	103	4,023,045	8	202,099	7.8	5.0
計		615	52,787,447	74	7,489,547	12.0	14.2

出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
(公財)神戸市公園緑化協会	土 木	18	138,146	2	26,244	11.1	19.0
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	—	—	—	—	—	—
(一財)神戸すまいまちづくり公社	土 木	14	801,013	3	611,170	21.4	76.3
	建 築	69	11,066,943	6	5,629,033	8.7	50.9
	設 備	49	3,358,525	7	1,590,875	14.3	47.4
阪神国際港湾(株)	土 木	17	430,171	1	123,984	5.9	28.8
	建 築	4	103,872	1	74,142	25.0	71.4
	設 備	15	3,590,849	2	2,952,087	13.3	82.2
(株) O M こ う べ	土 木	7	70,770	1	22,442	14.3	31.7
	建 築	25	3,847,515	1	3,173,841	4.0	82.5
	設 備	20	295,559	2	81,756	10.0	27.7
神戸交通振興(株)	土 木	0	0	0	0	0.0	0.0
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	0	0	0	0	0.0	0.0
計		238	23,703,363	26	14,285,574	10.9	60.3

合 計

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
計		853	76,490,810	100	21,775,121	11.7	28.5

備 考：(1)監査対象工事は、請負金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、平成28年3月31日時点における各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽 出 工 事 一 覧 表

危機管理室

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	1	防災行政無線保守管理業務	西菱電気(株) 大阪支店	24,084	H27.4.1	H28.3.31	随契

環境局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	2	西クリーンセンター 計装用空気圧縮機No.1 更新工事	(株)シキ	12,268	H27.9.2	H28.3.31	指名
	3	西クリーンセンター 焼却炉制御システム計算機 更新工事	富士電機(株) 関西支社	545,400	H27.7.1	H29.3.31	随契
	4	西クリーンセンター 水銀連続測定装置 設置工事	(株)エアシス	14,634	H27.11.27	H28.3.31	指名
	5	布施畑環境センター 破碎選別施設ごみヒット 消火設備更新工事	東報サービス(株)	24,030 (24,109)	H27.9.1 (H27.11.17)	H28.2.29	制限
	6	東クリーンセンター 1号灰押出機整備	川崎重工業(株)	17,496	H27.12.21	H28.2.27	随契
	7	苅藻島クリーンセンター クレーン設備定期点検整備及び 補修	JFEメカニカル(株) 関西営業部	12,960	H27.8.19	H27.11.30	随契
	8	資源リサイクルセンター NO.2破袋除袋機整備	川崎重工業(株)	6,696	H27.6.9	H27.7.31	随契

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	9	東部管内 緑地帯管理作業(その3)	(株)ランド・グリーン	18,360 (16,286) (16,308)	H27.4.10 (H28.2.4) (H28.3.24)	H28.3.31	指名
	10	西管内 緑地帯管理作業(その1-2)	藤井造園土木	28,620 (28,742)	H27.4.8 (H27.11.9)	H28.3.31	指名
	11	小野浜公園整備工事	名谷園造園土 木(株)	68,796 (79,175)	H26.10.2 (H27.5.27)	H27.5.31	制限
	12	しあわせの森整備工事 (その4)	(有)長井造園	11,543 (13,719)	H27.11.25 (H28.3.29)	H28.3.31	指名
	13	東町公園改修工事	若生緑化(株)	32,080 (31,723) (31,834)	H27.11.4 (H28.2.4) (H28.2.24) (H28.3.24)	H28.3.18 (H28.3.31)	制限
	14	垂水管内 公園施設改修工事(その3)	弥生造園(株)	14,117	H28.3.23	H28.8.12	指名
	15	西管内 公園施設改修工事(その4)	(株)緑翠園	12,325 (13,172)	H27.11.2 (H28.3.14)	H28.3.24	指名
	16	落合池改修工事	(株)協立道路サ ービス	22,680 (23,031)	H27.12.17 (H28.3.11)	H28.3.18	制限
	17	須磨浦公園他法面防護工事	日本ロード・メンテ ンス(株)	21,384 (21,492)	H27.9.30 (H28.2.8)	H28.2.20	制限
	18	白水中公園フェンス設置工事	(有)摩耶工業	5,324	H27.5.21	H27.8.31	指名
	19	口唐戸小公園フェンス設置工事	アクティブ・Gエンジ ンク(株)	5,090	H27.12.24	H28.3.18	指名

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	20	布引公園(布引ハーフ園内) 災害復旧工事(その1)	㈱南建設	10,962 (10,666)	H27.11.27 (H28.3.25)	H28.3.31	指名
	21	布引公園(布引ハーフ園内) 災害復旧工事(その2)	㈱南建設	3,186 (3,291)	H27.12.25 (H28.3.22)	H28.3.31	指名
	22	有野台4号及び7号周辺緑地 災害復旧工事	吉野建設㈱	18,252 (19,272)	H27.3.27 (H27.5.27) (H27.6.26)	H27.5.29 (H27.6.30)	随契
	23	再度公園内周遊路 災害復旧工事	㈱ゴッショー	13,478	H28.1.20	H28.5.25	指名

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	24	(仮称)本山第一住宅8号棟 建設工事 [24建築, 31機械, 32電気]	関西建設工業 ㈱	1,175,040 (1,193,994)	H27.2.23 (H27.3.23)	H28.11.20	制限
	25	(仮称)房王寺住宅14号棟 建設工事 [25建築, 33機械, 34電気]	丸正建設㈱	878,040 (890,304) (896,536)	H26.12.3 (H27.10.28) (H27.12.11) (H28.3.18)	H28.10.31 (H29.2.28)	制限
	26	水野住宅1,2号棟 とりこわし及び敷地整備工 事	㈱堂脇工業所	38,984 (41,943)	H27.6.30 (H27.12.4) (H28.3.11)	H27.12.25 (H28.3.29)	制限
	27	横尾住宅14号棟 耐震改修工事	㈱中田工務店	391,716	H27.6.8	H29.2.28	制限
	28	下山手住宅1号棟 外壁補修工事	東建設㈱	7,419	H28.1.26 (H28.3.24)	H28.3.31 (H28.4.28)	制限

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	29	竜が台住宅12,13号棟 外壁改修工事	(株)岡工務店	150,120 (163,712)	H27.7.27 (H28.2.3) (H28.3.7)	H28.2.29 (H28.3.15)	制限
	30	浜中住宅鉄部他改修工事	(株)カト	38,836 (41,077)	H27.9.4 (H28.1.12)	H28.1.15	制限
設備	31	(仮称)本山第一住宅8号棟 給排水設備工事 [24建築, 31機械, 32電気]	(株)山口商会	190,598	H27.3.25	H28.11.20	制限
	32	(仮称)本山第一住宅8号棟 電気設備工事 [24建築, 31機械, 32電気]	早水電機工業 (株)	147,666	H27.3.18	H28.11.20	制限
	33	(仮称)房王寺住宅14号棟 給排水設備工事 [25建築, 33機械, 34電気]	(株)新和商会	150,552	H27.3.12 (H27.12.9)	H28.10.31 (H29.2.28)	制限
	34	(仮称)房王寺住宅14号棟 電気設備工事 [25建築, 33機械, 34電気]	杉本電気工業 (株)	125,047	H27.3.4 (H27.12.14)	H28.10.31 (H29.2.28)	制限
	35	重池住宅8号棟・長田駅南 住宅給湯器更新工事	(有)金本設備 工業	24,411 (24,270)	H27.11.9 (H28.3.1)	H28.3.7	制限
	36	イースコート9番街 照明設備改修工事	(株)香山電機	14,631	H27.11.26	H28.7.31	指名
	37	HAT神戸・灘の浜住宅4番館 消防設備改修工事	(株)シデソ	21,926 (20,363)	H27.6.22 (H27.12.8)	H27.12.18	制限

みなと総局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	38	新港東地区 遮集管整備工事(その5)	関西建設工業 (株)	137,484 (262,332) (269,136) (275,670) (284,850)	H26.6.20 (H26.11.14) (H27.1.30) (H27.3.20) (H27.5.15) (H27.6.15) (H27.7.15)	H27.1.30 (H27.5.29) (H27.7.7) (H27.7.24)	制限
	39	新港東地区 側溝整備工事その2	(株)川本組	118,551 (126,910) (141,901)	H27.4.21 (H27.8.20) (H27.12.8) (H28.1.26)	H27.12.28 (H28.1.29)	制限
	40	新港第1突堤 エプロン改良及び緑地整備工事	(株)島田組	312,120 (289,386) (326,829) (341,409)	H26.12.17 (H27.3.31) (H27.7.29) (H27.8.11) (H27.10.22)	H27.8.31 (H27.10.30)	制限
	41	神戸新交通ポートピア大橋 耐震補強工事 その1	深井建設(株) 神戸営業所	394,200 (392,785) (401,101)	H26.7.31 (H27.1.19) (H27.3.27) (H27.5.22) (H27.9.15)	H27.3.31 (H27.6.30) (H27.9.30)	制限
	42	神戸空港島-7.5m岸壁 整備工事	神港建設興業 (株)	67,369 (84,994)	H27.7.31 (H28.1.13) (H28.2.5)	H28.1.29 (H28.2.19)	制限
	43	神戸空港造成及びその他 整備工事(その9)	兵庫奥栄建設 (株)	253,981 (302,942) (309,033) (311,420)	H26.5.12 (H27.3.31) (H27.5.26) (H27.6.26)	H27.6.30	制限
	44	兵庫運河地区(御崎本町) プロムナード整備工事(その1)	八雲建設(株)	50,760	H28.3.25	H28.9.16	制限
	45	荻藻島地区 防潮胸壁築造工事その3	中野工業(株)	68,472 (73,947)	H27.8.26 (H28.3.24)	H28.3.25	制限
	46	西神住宅第2団地 2-3工区整備工事	関西造園土木 (株)	125,747 (131,340) (142,004)	H26.12.12 (H27.3.27) (H27.5.26)	H27.5.31	制限
	47	神戸複合産業団地 区画道路21号線他整備工事 (その2)	関西建設工業 (株)	238,453	H27.8.21	H28.8.31	制限
	48	神戸複合産業団地 1号ダム雨水幹線築造工事 (その6)	関西建設工業 (株)	101,595 (109,684)	H27.8.21 (H28.2.29)	H28.3.31	制限
	49	臨港地区内 道路等維持補修工事 (単価契約)	(株)松建	108,140	H27.4.3	H28.3.31	制限

みなと総局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	50	ポートアイランド ムービングワーク他改修工事	(株)カイト	74,341 (83,305)	H27.11.25 (H28.3.22)	H28.3.24	制限
設備	51	六甲アイランド リハーモナルライトアップ設備工事	(株)三宅電気工 事	64,789 (69,897)	H27.7.15 (H27.10.27)	H27.10.31	制限
	52	神戸空港島 岸壁ヤード照明塔設置工事	(株)金森電気工 業所	25,628 (25,821)	H27.9.8 (H28.1.28)	H28.1.29	制限
	53	メリケンパーク 防潮鉄扉設置工事	松原熔工(株)	18,770 (18,993)	H26.12.16 (H27.5.25)	H27.5.29	制限
	54	六甲アイランド 1号上屋他高圧引込設備 改修工事	矢野電気工事 (株)	15,703 (16,664)	H27.12.17 (H28.3.24)	H28.3.25	指名
	55	出在家ポンプ場 ポンプ設備改修工事	クボタ機工(株) 大阪支店	12,960	H28.2.10	H29.2.28	随契
	56	大輪田ポンプ場 2号排水ポンプエンジン整備	タニハツディーゼル (株)	3,207	H27.10.20	H28.3.31	随契

水道局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	57	上ヶ原公舎 解体撤去及び敷地整備工事	(株)国組	11,127 (11,732)	H28.1.27 (H28.3.23)	H28.3.31	指名
設備	58	大容量送水管 奥平野立坑換気設備工事 [58機械, 59電気]	(株)新和商会	13,165	H27.9.2	H28.3.31	指名
	59	大容量送水管 奥平野立坑電気設備工事 [58機械, 59電気]	奥井電機(株)	66,808 (67,294)	H27.11.9 (H28.3.24)	H28.3.31	制限
	60	奥平野調整池 入水流量制御用 電気設備工事	(株)大同電機製 作所 神戸営業所	17,582 (18,284)	H27.10.21 (H28.3.22)	H28.3.31	指名
	61	押部谷ポンプ場 送水ポンプ設備更新工事	(株)荏原製作所 大阪支社	116,748	H27.11.18	H29.1.31	制限
	62	上ヶ原浄水場 構内監視用ITV装置 更新工事	平尾電工(株)	15,724	H27.12.16	H28.3.31	指名
	63	千苅浄水場 補機動力盤更新工事	扶桑電機工業 (株) 神戸営業所	15,356	H27.11.6	H28.3.31	指名
	64	千苅浄水場 消毒設備改修工事	横手産業(株)	99,727	H27.10.28	H28.9.30	制限
	65	甲東ポンプ場 3号導水ポンプ分解整備	(株)西島製作所 大阪支店	8,478	H27.7.29	H28.1.31	随契

交通局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	66	総合運動公園駅 便所バリアフリー化改修工事 [66建築, 67機械]	中居建設工業 (株)	34,241 (35,548)	H27.9.24 (H28.2.22)	H28.2.26	制限
設備	67	総合運動公園駅 便所バリアフリー化改修 機械設備工事 [66建築, 67機械]	岩本設備工業 (株)	9,528 (9,705)	H27.9.28 (H28.2.22)	H28.2.26	指名
	68	Uライオン三宮ビル 受変電設備更新工事	シエスタ(株)	13,924	H27.10.29	H28.3.25	指名
	69	海岸線 光ケーブル整備工事	日本電設工業 (株) 大阪支店	97,632 (98,744)	H27.3.24 (H27.4.23)	H27.12.25	制限
	70	海岸線 ITV送光器設備改修	(株)日立国際電 気 関西支社	20,898	H27.6.8	H28.3.25	随契
	71	大倉山駅 スクレーパー冷凍機分解整備業務	(株)神戸製鋼所	9,136	H27.12.1	H28.3.18	随契
	72	平成27年度 海岸線5000形車両 車輪はめ替え(その2)	新日鐵住金(株) 大阪支社	10,402	H27.10.7	H27.11.4	随契
	73	平成27年度 海岸線5000形車両 運転状況記録機能追加作業	(株)日立製作所 神戸支店	32,400	H27.7.17	H28.3.18	随契
	74	垂水営業所 燃料タンクラインシグ補修	興亜工業(株)	6,890	H27.10.5	H27.12.11	指名

(公財)神戸市公園緑化協会

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	75	花壇管理業務(三宮南エリア)	(株)二楽園	21,060	H27.4.1	H28.3.31	指名
	76	アジュール舞子園地管理作業	(有)栄光園芸	5,184	H27.3.11	H28.2.28	指名

(一財)神戸すまいまちづくり公社

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	77	葺合高校敷地整備工事	清水村上 特定建設工事 共同企業体	199,647 (244,063) (282,958)	H24.10.11 (H26.3.10) (H27.3.6)	H28.3.31 (H28.6.30)	一般
	78	市道野崎線(葺合高校北側交差点)整備事業における道路擁壁工事	清水村上 特定建設工事 共同企業体	82,728 (81,162)	H26.9.11 (H27.3.11) (H27.5.20)	H27.3.31 (H27.5.29)	随契
	79	(仮称)舞多聞小学校敷地整備工事	(株)中西総合ガーデン	247,050	H27.9.16 (H28.3.4)	H28.3.15 (H28.4.22)	指名
建築	80	新商業高校建設工事 [80建築, 86機械, 87電気]	大豊・神鋼興産 特定建設工事 共同企業体	3,402,000	H26.12.3	H28.11.30	随契
	81	(仮称)舞多聞小学校校舎新築工事 [81建築, 88機械, 89電気]	関建・今津・湊 特定建設工事 共同企業体	1,954,800 (1,889,207)	H26.10.7 (H28.3.4)	H28.3.15 (H28.4.22)	制限
	82	湊川中学校給食配膳室新築工事	タツミ工業(株)	35,046 (35,584)	H26.12.17 (H27.3.10) (H27.4.7)	H27.3.20 (H27.4.20)	指名
	83	本山南中学校給食配膳室増築他工事	(株)カイト	39,042 (43,055)	H27.2.24 (H27.5.27) (H27.6.19)	H27.5.29 (H27.7.6)	指名

(一財)神戸すまいまちづくり公社

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	84	市営HAT灘の浜4番館他 外壁改修工事	(株)益田工務店	217,404 (216,222)	H27.9.1 (H28.3.16)	H28.3.22	指名
	85	兵庫大開小学校屋内運動場 天井改修他工事	(株)須貝工務店	43,254 (42,965)	H27.6.12 (H27.9.18)	H27.10.31	指名
設備	86	新商業高校建設 機械設備工事 [80建築, 86機械, 87電気]	美樹・三樹 特定建設工事 共同事業体	484,380	H27.2.12	H28.11.30	制限
	87	新商業高校建設 電気設備工事 [80建築, 86機械, 87電気]	ダイワ電気工事 (株)	439,452	H27.2.13	H28.11.30	制限
	88	(仮称)舞多聞小学校 校舎新築機械設備工事 [81建築, 88機械, 89電気]	三樹エンジニアリ ング(株)	299,084 (311,120)	H26.11.27 (H28.3.4) (H28.3.22)	H28.3.15 (H28.4.22)	制限
	89	(仮称)舞多聞小学校 校舎新築電気設備工事 [81建築, 88機械, 89電気]	大宮電気工業 (株)	319,680 (310,103)	H26.11.20 (H28.3.4) (H28.3.28)	H28.3.15 (H28.4.22)	制限
	90	西神戸コルマ場 キュービクルおよびケーブル更新 工事	ダイワ電気工事 (株)	21,718	H28.1.7 (H28.3.28)	H28.3.31 (H28.4.28)	指名
	91	鈴蘭台中学校 消火設備他改修工事	(株)ダイワ設備	14,467 (15,131)	H27.7.15 (H27.10.7)	H27.10.16	指名
	92	北須磨文化センター 設備管理業務	日本管財(株)	8,971	H27.3.20	H28.3.31	随契

阪神国際港湾㈱

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	93	RC6コンテナクレーンレール改修工事	協同建設(株)	125,820 (123,984)	H27.12.14 (H28.3.15)	H28.3.22	指名
建築	94	RF1, RF2防水改修等工事	橋本建設(株)	65,988 (74,142)	H27.8.10 (H27.11.25)	H27.11.30	指名
設備	95	RC6, 7ベース コンテナクレーン製作据付工事 (その1)	三井造船(株)	2,880,000 (2,918,100)	H25.11.29 (H27.9.28) (H27.12.15) (H28.1.27)	H27.9.30 (H28.1.31) (H28.3.10)	指名
	96	RC6, 7ベース クレーンケーブル布設他工事	東洋電気工業 (株)	33,480 (33,987)	H27.5.18 (H27.10.1)	H27.10.21	指名

㈱OMこうべ

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	97	須磨パティオ1番館 屋上緑化工事	㈱山羽造園	19,595 (22,442)	H27.9.25 (H27.12.24)	H27.12.25	指名
建築	98	(仮称)「京コンピュータ前」駅前 パロットビル新築工事	東洋・寄神 特定建設工事 共同企業体	3,144,960 (3,173,841)	H27.11.20 (H28.1.20)	H28.6.30	制限
設備	99	須磨パティオ健康館 GHP更新工事	東洋冷熱工業 (株)	63,612	H27.10.9	H28.2.29	指名
	100	キャンパススクエアLED化工事	八千代電設工 業(株)	18,144	H27.11.5	H28.2.3	指名

備考 (1)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札, 「制限」は制限付一般競争入札, 「指名」は指名競争入札, 「随契」は随意契約を表す。また, (総評)は総合評価落札方式を表す。

(2)本表は, 平成28年3月31日時点における各局ならびに出資団体からの提出資料に基づき作成した。
