

令和 7 年 3 月 19 日

工 事 定 期 監 査 及 び 出 資 団 体 工 事 監 査 結 果 報 告

企画調整局、地域協働局、こども家庭局、経済観光局、
建設局、建築住宅局、消防局
神戸新交通(株)

神戸市監査委員	細	川	明	子
同	大	澤	和	士
同	福	本	富	夫
同	菅	野	吉	記

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項、第 4 項の規定に基づき実施した令和 6 年度第 2 期工事定期監査並びに出資団体工事監査について、同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

1 監査の対象

企画調整局、地域協働局（区役所含む）、こども家庭局、経済観光局、建設局、建築住宅局、消防局、神戸新交通(株)、における令和5、6年度施行工事について監査を行った。

工事の抽出状況は第1表、抽出工事は第2表のとおりである。

2 監査の期間

令和6年10月30日～令和7年3月19日

3 監査の方法

監査は、土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか（合規性）、また3E（経済性、効率性、有効性）並びに正確性、安全性などの観点から適切に行われているかについて、関係書類の審査、現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

4 対象工事の抽出

対象工事の中から、対象局・団体の工事件数の割合、規模、内容、契約方法、工期、進捗状況等及び重点項目を総合的に考慮して、抽出を行った。

5 重点項目

過去の指摘、事故の発生状況、潜在的リスク、社会動向、市民ニーズ、法令・技術基準等の改正への対応等からの共通リスクや、対象局・団体についての固有リスクを洗い出し、「影響度」と「発生頻度」からリスク評価を行った。このうち、「影響度」、「発生頻度」が共に大きいものから以下の重点項目を定め、監査項目の着眼点の中で重点的に確認を行う事項とした。

- ① 工事の事故防止対策（現場条件に応じた施工計画書と安全対策）
- ② 適正な積算（歩掛りの適用、見積りの精査）
- ③ 防災・減災への対応（地震、津波、高潮、風水害対策）

6 監査項目及び着眼点

監査は、(1)土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか（合規性）、(2) 3E（経済性、効率性、有効性）ならびに正確性、安全性および人にやさしい整備となっているかについて実施した。特に、重点項目については実査においても重要な着眼点とし重点的に行った。

さらに、内部統制の整備・運用状況について確認を行うとともに、「現場力の強化」の観点から、各所属の組織や人材面等についてアンケートやヒアリングによる調査を行った。

また、SDGsなど先進的な事例や取組についても調査を行った。

監査項目	着 眼 点
1. 計 画	計画書、事前協議及び諸手続きの状況
2. 設 計	設計の基本的事項、関係法規等の適用、設計基準等の整備状況及びその運用、設計図書の整備、設計の照査
3. 積 算	積算基準等の整備状況及びその運用、工種・数量・単価・歩掛り等の適用、積算の照査
4. 契 約	契約締結手続き、設計変更等の理由、手続き及び内容
5. 施 工	工事関係法規等、施工管理、工事関係書類、監督業務
6. 検 査	検査関係書類
7. 維持管理	保守点検関係書類
8. 委託業務	委託業務関係書類
9. 内部統制	リスクの評価と対応及び統制活動、情報の伝達状況

7 監査の結果

(1) 監査結果の概要

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正に行われているものと認められた。

しかし、事務の一部について、以下に述べる改善を要する事例が見られた。

ア 指摘事項

「積算（重点項目：適正な積算（単価・歩掛りの適用、見積りの精査）」については、単価・歩掛りの適用が不適正な1件の誤りが認められた。

これは設計変更の際に追加した単価の設定条件を誤ったため、積算額が過小となったものである。

積算においては精緻な作業を求められるが、引き続き不注意によるミスが発生しているので、原因究明と再発防止策について検討されたい。

イ 意見

「契約」については、請負契約審査会への付議とその後の契約手続きを適切に行っていないものが認められた。

契約の公正性・透明性を確保するためにも、適切な付議と契約手続きに努められたい。

ウ 内部統制の整備、運用状況

今回の監査対象となる7局1団体の監査対象所属に対し、設計・積算と安全管理に関して内部統制の整備、運用状況について確認を行った。

結果は、下表のとおりである。

リスク評価と運用状況	(共通) ・工事発注を多く行っている所属は、可能性のあるリスクとして認識し、リスク評価シートにリスクの発生原因、対策案の整理がなされていた。 ・技術職員が配置されていない所属では、監理や検査等を工事担当部署に技術支援を求めることで、リスクの低減が図られていた。
対応策の整備状況	(設計・積算) ・工事の設計・積算を行っている所属は、積算基準やマニュアルが整備されており、照査においてもチェックリストを活用するなど、ミスを減らす体制が構築されていた。 ・積算の違算防止のために、建築工事で先行導入している積算チェックツールについて、建築設備工事においてもR5年度に開発を行い、R6年度より試行運用を行っていた。 (工事の安全管理) ・事業者が作成した施工計画書を基に事前に作業内容の確認を行っていた。 ・施工計画書受領時に、チェックリストを用いて、必要事項の記載を確認してリスクを管理する取り組みを行う所属もあった。 ・局や事業所単位で工事監督ワーキングを適宜開催し、事業所共通ルール策定、及び工事関係書類の統一を図る取組が見られた。 ・局や所属単位で安全協議会等を設置し、安全講習会やパトロールを実施するなど、横断的に指導、監督を行っていた。 ・監督員による現場確認を適宜実施し、必要な指導、監督を行っていた。頻度については、各所属の業務体制や工事の規模などに応じて行なわれていた。 ・情報共有システムを活用し、監督員と請負人間の連絡・調整業務の省力化を図る所属があった。
職員への研修等取組状況	(共通) ・神戸市工事安全管理委員会からの情報や監査の指摘事項を所属職員で適宜共有するとともに、対策の検討を実施するなど、リスク対応を図っていた。 ・本市技術管理部門や外部機関が主催する講習会等に参加し、知識の修得を図っていた。

それぞれの実状に応じた整備、運用がおおむね実施されていた。今回の監査では、安全管理に関する指摘等がなく、対象局の今年度事故件数も昨年度同時期に比べてわずかながら減っている。しかし、依然として工事事故が多発していることから、各所属においては、内部統制の整備、運用状況について評価を行い、充実強化に取り組まれない。

今後の工事監査では、引き続き、設計・積算、安全管理について重点的に検証を行うとともに、内部統制の整備及び運用状況について監視を行う。

併せて、各局に対し、より具体的に改善の方向性を示して提案するとともに、工事全般の統括部署に対しても迅速な対応を求めている。

また、技術管理部門との連携や職員向けの情報共有ツールによる周知啓発を継続して行っている。

エ 現場力の強化に関する調査結果

今回の監査対象となる所属に対し、「現場力の強化」の観点から、工事担当部署の組織や人材面等についてアンケート調査を行った。

アンケートの回答があった 22 所属については、全体的に職場の問題解決能力は高く、チームワークが良く、モチベーションは比較的高いと認識していることがわかった。その一方で、安全管理や職場での教育・研修の充実度は普通（標準的）であると考えている所属が多かった。

さらに、所属長から現場力に関するヒアリングを行ったが、以下のような事例報告があった。

（ア）現場力を感じた事例

能登半島地震における災害支援では、発災直後から下水道施設の被災状況調査などの支援を行ってきた。現地は下水道の台帳が無いなど多くの課題があったが、被災地支援に行く職員だけでなく、台帳作成などの後方支援も含めて、現場事務所と本庁各所属が一体となった支援活動が出来た。また、支援を通して得られる知識・経験は、特に震災経験のない若手職員の大きな財産となった。

所属においては、現場力を養い、向上させることの重要性を認識していた。引き続き教育・研修の拡充や資格取得支援制度の活用によって、職員のスキル獲得を図ると共に、相談しやすい雰囲気づくり、過去の経験のデータベース化で組織力を強化するなど、更なる現場力の強化に努められたい。

オ SDGs 推進に貢献する取組

SDGs を推進する視点で監査を実施した結果、以下のような取組事例が見られた。

（ア）経済観光局

須磨海づり公園の再整備工事では、撤去した釣台を人工魚礁の材料として活用し、魚を育む場を育成することで、豊かな海づくりに資する取組が見られた。


この魚礁の整備に際しては、事前に海底の形状や潮流等の自然条件を調査した上で地元漁業者との協議を重ね、安全かつ高い効果が期待できるよう計画されていた。さらに、効果や影響は定期的に観察される予定である。

(イ) 建設局

【下水道事業】

建設局では下水道管路の改築および耐震補強工事に取り組んでいる。城が山1丁目地区他污水管耐震化工事では、主に更生工法(非開削)^(注)による污水管の耐震化工事を行っていた。これにより、道路開削等に伴う産業廃棄物の発生を抑制し環境負荷の低減を図るとともに、社会インフラの長寿命化に寄与する工事が実施されている。

また、特に当該区間は、災害時に拠点となる重要施設の下流や緊急輸送路に埋設されている污水管であることから、災害時のリスクマネジメントとしても効果が高いものとなっている。

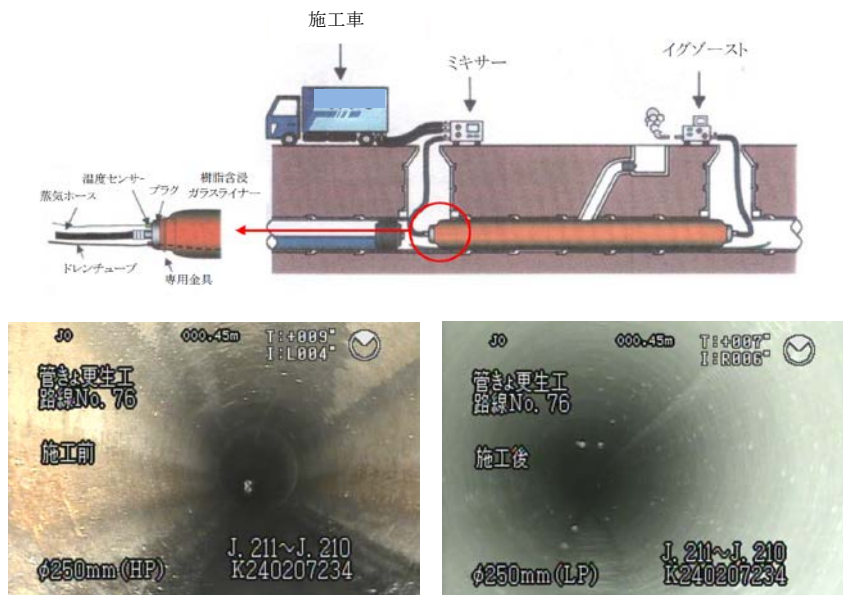

(注) 更生工法（非開削）

老朽化等により機能が損なわれた管を道路を開削せずに管の内面から更生する工事の方法。

道路上のマンホールから専用の材料を挿入し、中で膨らませ、その後に、熱や光などで材料を硬化させて、既設の下水道管の中に新しい管を作る。

神戸駅周辺地区浸水対策事業では、10年に1回程度の確率で発生する降雨に対応できる雨水幹線や雨水ポンプ場の整備を行っている。さらに、近年の気候変動による降雨量の増加が見込まれることから、浸水シミュレーションを用いた解析を行い、重大リスクの発生についての検証をするなどし、対策の効果について確認をしている。

また、当該事業で整備を行った雨水ポンプ場においては、BIM^(注)による3次元モデルを活用し、構造物と配管・ダクト等のモデル化、干渉チェックを行い、作業の手戻りの発生防止、効率的な資材搬入が行われていた。

(ウ) 建築住宅局

旧アメリカ領事館官舎の耐震補強工事において、モダン建築祭^(注)、地元見学会等で工事現場の一般公開が行われていた。

現地で漆喰塗の工程見本、継ぎ手の模型等、当該建物の文化的な特徴や、伝統的価値を維持するための技法を紹介することにより、文化財建造物への理解を深め、文化財及び文化財を保護するための技法を後生へ受け継いでいく取組が行われていた。



(注) モダン建築祭

2023 年から実施されている建築一斉公開イベント。戦災や震災を乗り越え神戸の記憶を受け継ぐモダン建築が、日時限定で特別に公開される。

こうべ小学校の増築整備において、断熱性能^(注)向上による省エネに対する取組のほか、内装材、家具類に兵庫県産木材を積極的に使用する取組が見られた。



また、学校の大規模改修工事において、太陽光発電施設が未設置かつ構造上設置可能な学校に新設している。

太陽光発電施設の設置により、学校施設で再生可能エネルギーを活用すると共に、災害時の避難所機能として、発電した電力を災害時の非常用コンセント電源として利用する取組が見られた。

(注) 断熱性能

建築物省エネ法において、建物の断熱性能を評価する指標として、年間熱負荷が定められている。年間熱負荷は、建物からの熱の逃げやすさ、建物への日射熱の入りやすさ等から建物の断熱性能を見る指標で、平成 28 年基準値に対する削減率で表される。

本建物では、年間熱負荷が 0.64 であり、建築物を環境性能で評価し、格付けする建築環境総合性能評価システム（キャスビー）において、建物外皮の熱負荷抑制の項目で、最上位の評価点 5（0.8 以下）を取得している。

(2) 監査結果

○ 指 摘 事 項

ア 積 算（重点項目：「適正な積算（歩掛りの適用、見積りの精査）」）

交通誘導員費の単価選定を適正に行うべきもの

本工事は、中央区にある旧アメリカ領事館官舎の耐震補強等を行うものである。

「神戸市建築工事積算要領」では、交通誘導警備に係る費用は、共通仮設費に交通誘導員費を積み上げ計上すると規定されている。

交通誘導員費とは、労働者本人が受け取る賃金としての労務単価である交通誘導警備員費に、下請経費及び小器材（工具類）の損耗費等を加えたものである。

本工事では、当初設計で交通誘導警備に係る費用に交通誘導員費を正しく使用していたが、設計変更で追加した交通誘導警備に係る費用に交通誘導員費ではなく、労務単価である交通誘導警備員費を使用していたため、積算額が過少となっていた。

設計変更における積算は、工事の契約額に直接影響するものであるため、本工事の積算について十分な検証を行うとともに、再発防止に向けて、設計変更に伴い追加作成した単価が当初設計の単価と同種のものであっても、内容確認を行う等により、適正な積算を徹底すべきである。

（建築住宅局建築課）

[No.35 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事]

（請負金額 351,439 千円）

○ 意 見

ア 契 約

請負契約審査会への付議と契約手続きを適切に行うべきもの

本業務は、神戸臨床研究情報センターに設置されている非常用発電機の分解整備を行う業務であり、請負人と随意契約を締結している。

随意契約とは競争によらず特定の相手方を選択して、これと契約する方法であり、随意契約ができるのは、契約相手方でないと目的を達することができない具体的な事由がある場合等に限られる。

本市では、請負契約事務の公正かつ的確な執行を確保するため、神戸市請負契約審査会（以下審査会と言う）を設置しており、随意契約について一定の要件に該当する場合は、当審査会に付議する必要がある。

なお、審査会では、①随意契約理由が法令に適合しているか、②請負先が適切か、③入札するべきではないか、について審査を行っている。

また、契約手続きにおいては、審査会の審議結果と随意契約理由書の内容を照合し、決裁の上、業者と契約手続きを行うこととなっている。

本業務は審査会対象の案件であったが、審査会の付議を受ける際に議案書の決裁者区分を誤っていた。

さらに、契約担当課との事前協議により議案書の随意契約理由を精査して審査会に付議し、承認を得ていたが、その後の契約手続きにおいて、契約書類に添付する随意契約理由書に転記する際に、誤って精査前の随意契約理由を記載していた。その結果、公表した随意契約理由も誤っていた。

随意契約の公正性・透明性を確保するためにも、審査会への付議とその後の契約手続きを適切に行うように努められたい。

（企画調整局医療産業都市部）

[No. 01 神戸臨床研究情報センター非常用発電機整備]

（請負金額 19,360 千円）

第 1 表 抽 出 状 況 表

工事定期監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
企 画 調 整 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	4	63,118	1	19,360	25.0	30.7
地 域 協 働 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	1	5,500	—	—	—	—
	設 備	5	52,325	1	5,500	20.0	10.5
こ ども 家 庭 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	1	7,700	—	—	—	—
	設 備	8	186,298	1	115,500	12.5	62.0
経 済 観 光 局	土 木	7	1,631,670	1	500,346	14.3	30.7
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	20	169,172	2	19,949	10.0	11.8
建 設 局	土 木	160	35,076,867	11	8,572,395	6.9	24.4
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	140	25,972,929	16	7,537,573	11.4	29.0
建 築 住 宅 局	土 木	13	599,020	1	104,000	7.7	17.4
	建 築	116	22,948,379	14	6,675,740	12.1	29.1
	設 備	148	7,319,618	14	1,426,171	9.5	19.5
消 防 局	土 木	—	—	—	—	—	—
	建 築	—	—	—	—	—	—
	設 備	30	1,372,645	1	7,004	3.3	0.5
計		653	95,405,242	63	24,983,538	9.6	26.2

出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
神 戸 新 交 通 (株)	土 木	21	1,900,540	2	857,483	9.5	45.1
	建 築	6	213,093	1	81,345	16.7	38.2
	設 備	58	8,847,439	4	2,821,836	6.9	31.9
計		85	10,961,073	7	3,760,664	8.2	34.3

合 計

(単位 金額：千円)

区 分		監 査 対 象 工 事		抽 出 工 事		抽 出 率 (%)	
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
計		738	106,366,315	70	28,744,202	9.5	27.0

備 考：(1)監査対象工事は、請負金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、令和6年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽 出 工 事 一 覧 表 (案)

企画調整局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	1	神戸臨床研究情報センター非常用発電機整備	(株)カワサキマシンシステムズ 統括本部 ガスタービンサービス本部西部事業所	19,360	R5. 9. 22	R6. 3. 31	随契

地域協働局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	2	神戸市男女共同参画センター等設備 総括管理業務	ポート産業(株)	5,500	R5. 4. 1	R6. 3. 31	指名

こども家庭局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	3	神戸市こども家庭センター施設総合 管理業務	神戸ダイヤモンドメンテ ンス(株)	115,500	R4. 11. 17	R7. 10. 31	指名

経済観光局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	4	須磨海づり公園撤去及び再整備工事 (その1)	東亜建設工業(株)	493,900 (500,346)	R5. 3. 22 (R5. 11. 29)	R5. 11. 30	制限 (総評)
設備	5	産業振興センター泡消火設備整備業 務	ケーテーシステム(株)	4,675	R5. 6. 13	R6. 3. 29	指名
	6	東部市場第二冷蔵庫棟搬送システム 更新	(株)ダイフク 工事・サー ビス本部 神戸第1カス タマーステーション	15,273	R5. 5. 26	R6. 3. 31	随契

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	7	神戸港地方字前山災害復旧工事	八雲建設(株)	67,430 (68,721) (70,851)	R5. 3. 24 (R5. 4. 26) (R6. 1. 15) (R6. 2. 26)	R6. 1. 31 (R6. 2. 29)	制限
	8	緊急防災対策工事（北区有野町有野）その2	安場建設(株)	75,523 (66,401) (67,194)	R5. 12. 20 (R6. 4. 12) (R6. 5. 7)	R6. 5. 31	制限
	9	準用河川烏原川・小部川合流部改修工事	株共新建設	30,690 (33,257)	R5. 8. 17 (R6. 2. 26) (R6. 3. 27)	R6. 2. 29 (R6. 3. 29)	制限
	10	海運町雨水幹線他改築工事	港建設(株)	163,675 (251,550) (220,209)	R4. 8. 31 (R5. 7. 21) (R6. 3. 26)	R5. 7. 31 (R6. 3. 29)	随契
	11	前池町2丁目地区他污水管改築更新工事（その2）	伊丹産業土地開発(株)	101,541 (121,000)	R5. 3. 3 (R5. 12. 4) (R6. 3. 26)	R6. 1. 31 (R6. 3. 29)	制限
	12	木津川3-1号雨水幹線他改築工事	京阪神道路サービス(株)	87,450 (87,908) (93,770)	R5. 3. 3 (R5. 3. 17) (R5. 9. 20) (R5. 10. 17)	R5. 9. 29 (R5. 10. 20)	制限
	13	城が山1丁目地区他污水管耐震化工事	株島田組	234,300	R5. 10. 11 (R6. 9. 6)	R6. 9. 30 (R6. 10. 31)	制限
	14	神戸駅前再整備に伴う污水管移設工事	株ランドグリーン	60,093 (61,262) (76,202)	R6. 3. 14 (R6. 4. 15) (R6. 8. 29)	R6. 8. 30 (R6. 11. 29)	制限
	15	三宮歩行者用デッキ整備に伴う污水管移設工事	株HOURYU	119,350	R6. 5. 22	R7. 3. 31	制限
	16	垂水处理場本場2系1号最初沈殿池他下水道土木施設防食被覆工事	日本ジッコウ(株)	153,450 (149,229)	R5. 12. 28 (R6. 5. 22) (R6. 8. 29)	R6. 7. 31 (R6. 9. 2)	制限 (総評)
	17	神戸駅周辺地区浸水対策事業	清水建設・西原環境・日新電機・ニュージェック特定建設工事共同企業体	7,266,600 (7,387,031)	R3. 3. 19 (R6. 3. 25)	R7. 6. 30	一般 (総評)

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	18	垂水処理場 麗水プラント改築工事	㈱神鋼環境ソリューション	195,347 (198,707) (200,251)	R3.12.13 (R5.1.20) (R5.3.17)	R5.3.17 (R6.1.31)	制限
	19	玉津処理場 中央監視設備工事	三菱電機㈱	1,070,080 (1,074,001) (1,109,450)	R4.3.31 (R4.5.18) (R4.12.20) (R5.2.14) (R6.3.15)	R6.3.1 (R7.3.31)	制限 (低入)
	20	東灘処理場汚泥処理施設改築更新等 事業 工事請負契約	㈱神鋼環境ソリューション	4,576,000	R4.11.18	R11.2.28	一般
	21	深江大橋ポンプ場 1号汚水ポンプ 改修工事	㈱荏原製作所	11,990	R5.9.11	R6.3.15	随契
	22	東灘処理場1・2号汚水ポンプV V V F 他更新工事	三菱電機㈱	94,490 (99,786)	R4.5.10 (R6.3.21)	R6.3.31	制限
	23	鈴蘭台処理場 オゾン機械設備工事 [26電気]	㈱神鋼環境ソリューション	407,000	R4.11.9 (R6.3.12)	R6.3.22 (R6.9.30)	制限
	24	西部処理場 2号汚泥脱水機機械設 備工事	㈱神鋼環境ソリューション	499,180 (513,486)	R4.12.6 (R6.3.12)	R6.3.15 (R6.9.30)	制限
	25	和田岬ポンプ場 1号自動除塵機機 械設備工事	スエヒロシステム㈱	65,190	R5.2.21	R5.12.22	制限
	26	鈴蘭台処理場 オゾン電気設備工事 [23機械]	大栄電機㈱	77,116	R4.12.21 (R6.3.11)	R6.3.22 (R6.9.30)	制限
	27	塩屋ポンプ場 沈砂池スクリーン設 備工事	三菱化工機 (株)	213,400 (218,037)	R4.12.16 (R5.12.11) (R6.1.18)	R5.12.15 (R6.1.24)	制限
	28	玉津処理場 3号汚水スクリーン改 修工事	㈱日立プラントサー ビス	33,000	R5.8.21	R6.3.15	随契
	29	玉津処理場 2号汚水ポンプ改修工 事	(株) 西島製作所	28,600	R6.5.10	R7.3.19	随契
	30	垂水処理場 東系水処理1系DO計 他更新工事	鹿島環境エンジニア リング㈱	20,988	R5.8.23	R6.1.31	制限
	31	玉津処理場 太陽光発電設備改修工 事	黒住電気工事㈱	20,476	R5.9.25	R7.2.28	制限

建設局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	32	宇治川ポンプ場 電気設備改修	(株)明電エンジニアリング 関西支社	129,800	R5. 8. 9	R6. 7. 31	随契
	33	玉津処理場 砂ろ過設備 2号洗浄水ポンプ改修	(株)荏原製作所 大阪支社	26,400	R5. 8. 4	R6. 3. 15	随契

建築住宅局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	34	垂水図書館建設工事に伴う雨水幹線移設工事	(株) 神盟	84,700 (102,449) (103,999)	R5. 7. 24 (R6. 1. 31) (R6. 2. 27)	R6. 2. 28	制限
建築	35	旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事 [49機械][56電気]	(株)中島工務店	174,900 (178,629) (183,744) (191,675) (194,766) (203,500) (208,351) (288,838) (351,439)	R2. 9. 7 (R3. 2. 24) (R3. 9. 3) (R4. 1. 31) (R4. 11. 29) (R5. 2. 24) (R5. 5. 15) (R6. 3. 7) (R6. 5. 27)	R4. 7. 31 (R4. 11. 30) (R5. 5. 17) (R6. 3. 31) (R6. 5. 31) (R6. 8. 30)	随契
	36	こうべ小学校校舎増築他工事 [51機械][57電気]	明和・大木特定建設 工事共同企業体	1,505,900 (1,514,359) (1,602,755) (1,637,097) (1,653,377)	R4. 9. 21 (R5. 4. 24) (R5. 11. 2) (R6. 3. 27) (R6. 6. 5)	R6. 8. 31 (R7. 1. 31)	制限 (低入)
	37	西部処理場北系水処理施設築造工事 (建築) その2 [52機械][58電気]	戸田・岩田地崎特定 建設工事共同企業体	2,249,084 (2,260,436) (2,277,992) (2,285,576)	R4. 11. 17 (R5. 6. 19) (R6. 1. 18) (R6. 3. 4) (R6. 3. 6)	R6. 3. 29	随契
	38	須磨海浜水族園本館解体撤去工事	(株)竹中工務店	720,500 (698,797)	R5. 2. 17 (R6. 3. 14)	R6. 3. 15	随契
	39	広陵小学校大規模改修工事	(株)岡 工務店	193,600 (206,305)	R5. 6. 16 (R6. 2. 26)	R6. 2. 29	制限
	40	明親小学校大規模改修工事	(株)須貝工務店	191,279 (191,598) (231,869)	R5. 7. 5 (R6. 2. 19) (R6. 3. 25)	R6. 3. 15 (R6. 3. 29)	制限
	41	東垂水小学校大規模改修工事	(株)隆建	182,919 (205,535)	R5. 7. 7 (R6. 2. 28)	R6. 2. 29	制限
	42	湊川中学校・楠高等学校大規模改修工事	(株)須貝工務店	217,888 (246,917)	R5. 7. 13 (R6. 3. 14)	R6. 3. 15	制限

建築住宅局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	43	長田消防署待機室個室化改修工事	柳原建設(株)	123,948 (130,548)	R5. 7. 24 (R6. 3. 7) (R6. 4. 18)	R6. 3. 15 (R6. 4. 24)	制限
	44	高丸小学校こどもひろば整備工事	丸正建設(株)	158,180 (160,391) (163,163) (166,771)	R5. 7. 26 (R6. 2. 19) (R6. 3. 26) (R6. 5. 10)	R6. 3. 29 (R6. 5. 15)	制限
	45	竜が台小学校昇降機棟増築他工事	(株)リキョー	101,475 (101,893) (116,534)	R5. 8. 7 (R6. 3. 11) (R6. 3. 26)	R6. 3. 15 (R6. 3. 29)	制限
	46	垂水処理場ブロワ棟他 2 棟建具改修工事	(株)赤松工務店	43,868 (45,562)	R5. 10. 10 (R6. 1. 16) (R6. 3. 28)	R6. 2. 29 (R6. 3. 29)	制限
	47	中央卸売市場本場水産卸売棟外壁改修他工事 [59電気]	明石土建(株)	177,870 (187,473)	R5. 11. 27 (R6. 5. 23)	R6. 5. 31	制限
	48	旧北区役所解体撤去他工事	(株)小総	149,037	R5. 12. 1 (R6. 6. 25)	R6. 6. 28 (R6. 10. 31)	制限
設備	49	旧アメリカ領事館官舎耐震補強他機械設備工事 [35建築][56電気]	セーバー技研(株)	14,825 (14,858) (15,034) (21,689)	R2. 9. 29 (R4. 7. 28) (R4. 11. 29) (R5. 5. 15) (R6. 3. 28) (R6. 8. 29)	R4. 7. 31 (R4. 11. 30) (R5. 5. 17) (R6. 3. 31) (R6. 8. 30)	制限
	50	神戸ファッションマート空調ポンプ更新工事	(株)西尾設備	51,480 (55,990)	R4. 7. 22 (R4. 12. 20) (R6. 1. 29)	R4. 12. 23 (R6. 1. 31)	制限
	51	こうべ小学校校舎増築他給排水設備工事 [36建築][57電気]	(株)新和商会	217,470 (215,457) (218,020)	R4. 12. 14 (R6. 3. 26) (R6. 8. 28)	R6. 8. 31 (R7. 1. 31)	制限
	52	西部処理場北系水処理施設築造工事 (建築機械設備) [37建築][58電気]	(株)新和商会	233,970 (235,576) (240,262)	R5. 4. 27 (R6. 3. 22) (R6. 5. 28)	R6. 3. 29 (R6. 5. 31)	制限
	53	西部処理場 管理棟給湯ボイラ取替工事	(株)ASTCIA	11,396 (12,595)	R5. 10. 23 (R6. 3. 15)	R6. 3. 22	制限
	54	小磯記念美術館空調設備他改修工事 [61電気]	(株)長村商会	187,000 (190,311)	R5. 12. 4 (R6. 7. 16)	R6. 7. 31	制限
	55	本庁舎 1 号館湯沸室他機械設備改修工事	(株)神報建設工業所	67,650 (69,355)	R6. 3. 8 (R6. 4. 3)	R7. 1. 31	制限

建築住宅局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	56	旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事 [35建築][49機械]	㈱甲友電気設備	26,945 (26,791) (26,857) (27,308) (37,571)	R2. 9. 29 (R3. 2. 8) (R4. 7. 26) (R4. 11. 25) (R5. 5. 15) (R6. 3. 28) (R6. 8. 29)	R4. 7. 31 (R4. 11. 30) (R5. 5. 17) (R6. 3. 31) (R6. 8. 30)	制限
	57	こうべ小学校校舎増築他電気設備工事 [36建築][51機械]	ミナト電気工事㈱	242,000 (242,209) (245,201)	R4. 11. 25 (R6. 3. 26) (R6. 8. 21)	R6. 8. 31 (R7. 1. 31)	制限
	58	西部処理場北系水処理施設築造工事 (建築電気設備) [37建築][52機械]	早水電機工業㈱	194,808 (196,183) (216,467)	R4. 12. 14 (R6. 3. 26) (R6. 5. 28)	R6. 3. 29 (R6. 5. 31)	制限
	59	中央卸売市場本場水産卸売棟他受電設備更新工事 [47建築]	サン電設工業㈱	48,213 (48,488) (55,341)	R5. 6. 5 (R5. 8. 29) (R6. 2. 28)	R6. 2. 9 (R6. 3. 1)	制限
	60	福田小学校太陽光発電設備設置他工事	(有) 高原電工	25,945 (26,836)	R5. 7. 10 (R6. 2. 14) (R6. 3. 18)	R6. 2. 16 (R6. 3. 26)	制限
	61	小磯記念美術館非常用発電設備更新工事 [54機械]	日光電気工事㈱	17,356	R5. 7. 27	R6. 3. 1	制限
	62	魚崎浜公園野球場照明施設改修工事	マサニ電気㈱	42,295 (42,504) (45,232)	R5. 7. 28 (R6. 3. 5) (R6. 3. 27)	R6. 3. 15 (R6. 3. 29)	制限

消防局

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
設備	63	川崎式BK117C-2型ヘリコプターの修理作業(その1)	川崎重工業㈱ 関西支社	7,004	R6. 1. 19	R6. 2. 28	随契

神戸新交通

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
土木	64	令和5年度 六甲アイランド線 魚崎駅耐震補強工事	ブリッジメンテナンス㈱	637,285 (648,021)	R5. 11. 10 (R6. 4. 12)	R7. 3. 25	指名
	65	令和5年度 六甲アイランド線 橋梁補強補修工事(その2)	ブリッジメンテナンス㈱	208,692 (221,342) (209,462)	R5. 6. 30 (R5. 9. 6) (R6. 3. 21)	R6. 3. 31	指名

神戸新交通

工事 種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約 の 方法
建築	66	貿易センター駅外壁・屋根改修工事	㈱ウェイズ	78,980 (81,345)	R5.10.6 (R6.3.27)	R6.3.28 (R6.4.30)	指名
設備	67	令和5年度 車両基地給水設備改修工事	㈱新和商会	11,363 (16,741) (16,741)	R5.9.6 (R6.1.30) (R6.3.28)	R6.1.31 (R6.3.29) (R6.4.30)	指名
	68	神戸新交通 運管PTC及び案内表示装置更新工事	㈱神戸製鋼所	1,912,900 (1,951,400)	R2.7.2 (R5.2.13)	R6.3.31	随契
	69	神戸新交通ポートアイランド線 配電ケーブル更新工事	㈱リョウセイ	130,680	R4.11.30	R6.3.25	指名
	70	自動券売機・自動精算機・画像イン ターホンシステム更新及び付帯工事	㈱高見沢サイバネ ティックス	708,180 (728,392)	R4.11.6 (R6.2.13)	R7.3.31	指名

- 備考：(1)「請負人名」欄の「特定JV」は特定建設工事共同企業体を表す。
(2)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札，「制限」は制限付一般競争入札，
「指名」は指名競争入札，「随契」は随意契約を表す。
(総評)は総合評価落札方式，(低入)は低入札価格調査基準価格未満で契約した工事を表す。
(3)表は令和6年8月31日時点における契約監理システムのデータと各局及び出資団体提出資料から作成。
