

社会資本総合整備計画 事後評価書 (案)

審議資料-11

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・本整備により安全な広域防災拠点としての機能を確保できた。 																
II 定量的指標の達成状況		<table border="1"> <tr> <td>最終目標値</td> <td>100%</td> <td>目標値と実績値 に差が出た要因</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> ・目標を達成した。 </td></tr> <tr> <td>最終実績値</td> <td>100%</td> <td></td> <td colspan="3"></td></tr> </table>	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・目標を達成した。 			最終実績値	100%								
最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・目標を達成した。 															
最終実績値	100%																	
指標②		<table border="1"> <tr> <td>最終目標値</td> <td></td> <td>目標値と実績値 に差が出た要因</td> <td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>最終実績値</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"></td></tr> </table>	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因				最終実績値									
最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因																
最終実績値																		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ・安全な広域防災拠点としての機能を確保した結果、緊急事態以外の通常利用においても公園の安全性を確保することができた。 																
3. 特記事項（今後の方針等）																		
<ul style="list-style-type: none"> ・市民が安全に、安心して公園を防災の拠点として活用できるよう、今回整備を実施した北神戸田園スポーツ公園をはじめとして、市内の公園の適切な維持管理を今後も継続的に行っていく。 																		

社会资本総合整備計画

神戸市建設事業外部評価委員会 第二回委員会


防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

担当：建設局公園部計画課

1

はじめに

緑の基本計画について

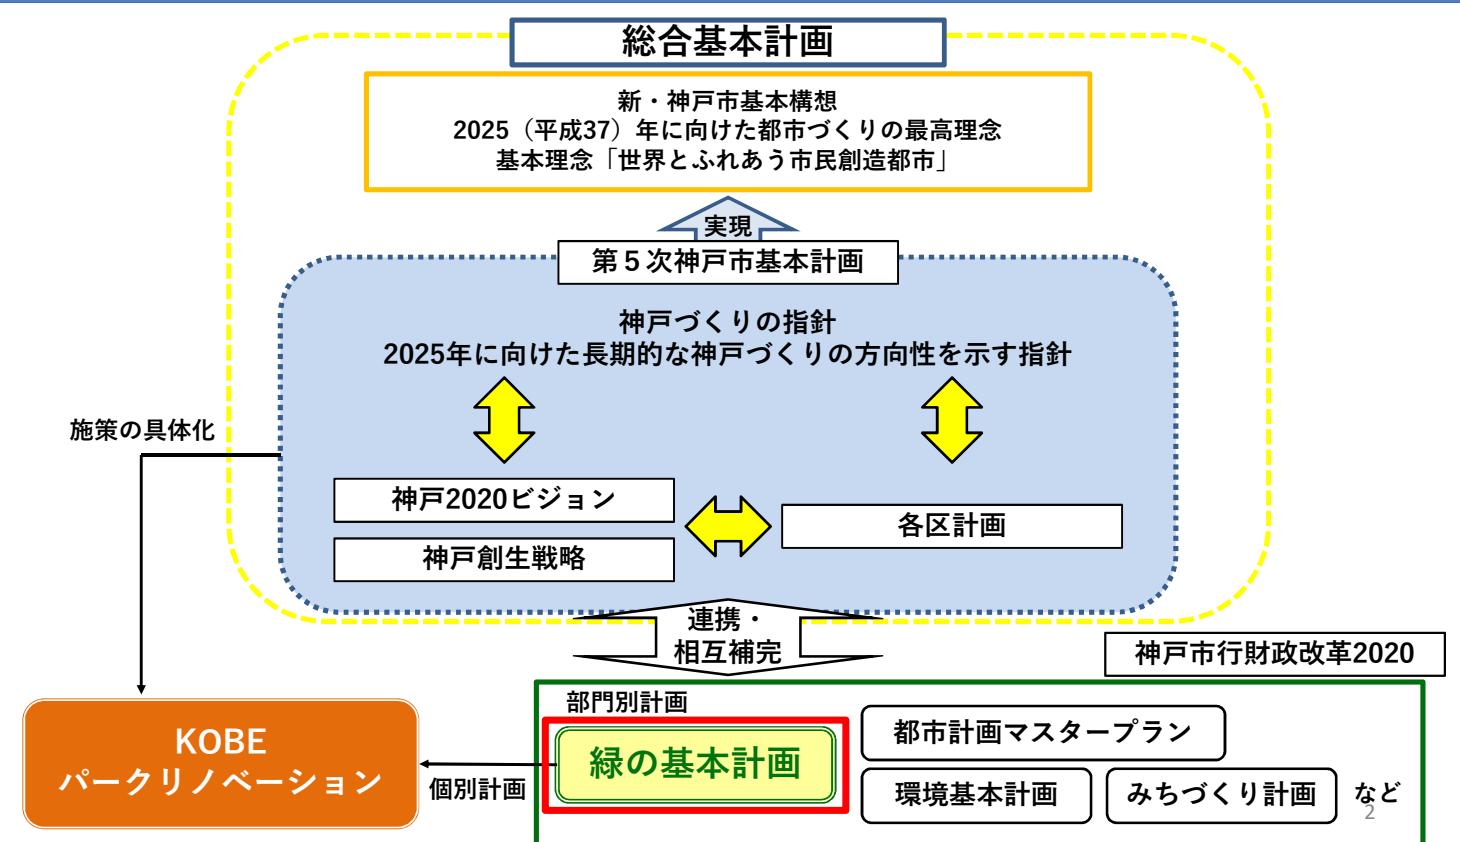

はじめに

緑の基本計画について

緑の基本計画の構成



緑の基本計画の基本理念

○地域ごとの緑の特徴から神戸市を3つにゾーニングし、各ゾーンの特徴を生かした施策を展開

○3つのゾーンを有機的につなげることで、豊かな水と緑に包みこまれたまちをめざす。



「緑とともに永遠に生き続ける都市=緑生都市」



3

はじめに

緑の基本計画について

第5次神戸市基本計画

神戸づくりの指針 (目標年次 2025年)

連携

反映・実現

連携

連携

神戸2020ビジョン

施策として

- ◆安心なくらしづくり
(1)多様なすまいづくり
(2)身近な公園の再生

部門別計画

グリーンコウベ21プラン ～神戸市緑の基本計画～ (目標年次 2025年)

上位計画で定める目標の具体化に向けた実行計画

六甲山森林整備戦略

KOBEパークリノベーション

六甲山森林整備戦略

- ⇒森林整備の実施に向けた基本的な考え方
①戦略的ゾーニングによる森林整備の推進
②多様な主体との協働による森林の育成・活用

など

KOBEパークリノベーション

- ⇒施策を力強く推進するモデル事業
①にぎわいのある公園づくり
②ストックを活用した公園づくり
③市民が主役の公園づくり

など

4

施策の展開と具体的な取り組み

※  内は本整備計画に対応する取組方針

六甲山系や帝釈・丹生山系などの緑を保全・育成・活用し、市民のくらしや自然環境・美しい景観を守ります。

- 取り組み(1) 森林レクリエーション施設の充実
- 取り組み(2) みどりの聖域づくり
- 取り組み(3) 自然災害から人とまちを守る森づくり 等

魅力と活気あるまちづくりを進めるとともに、震災の教訓を活かした安全で快適なまちづくりを目指します。

- 取り組み(1) 時代のニーズに対応した公園施設等のリニューアルと適切な保全
- 取り組み(2) シンボルとなる公園の魅力向上
- 取り組み(3) 公園等の安全性の向上とバリアフリー化 等

農地・里山等における生物多様性に配慮した自然環境の保全・育成や、農村地域のコミュニティの活性化を図ります。

- 取り組み(1) 生物多様性シンボル拠点整備の推進
- 取り組み(2) 田園地域のコミュニティ拠点の整備促進 等

対応する整備計画

社会资本整備総合交付金

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 国家的関連事業の開催に対応した都市公園の整備 |
| 2 | 地域ニーズに即した都市公園ストックの再編 |
| 3 | 安全・安心や環境に配慮した公園整備等の推進 |

防災安全交付金

- | | |
|---|-------------------------------|
| 4 | 「安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）Ⅱ」 |
| 5 | 「長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）」 |
| 6 | 「防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）」 |

1. 整備計画の内容

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

○計画の名称

社会资本総合整備計画

「防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）」

○計画の期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

○交付対象

神戸市

1. 整備計画の内容

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

○計画の目標

自然災害の発生等を受けて、土砂災害等に対する街の防災性の向上を図り、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指す。

○計画の成果目標（定量的指標）

- ①台風等により災害の発生した公園の内、神戸市地域防災計画に基づき、広域防災拠点に指定されている都市公園の災害対策を行い、安全な広域防災拠点としての機能を確保する。
(安全な広域防災拠点の割合:88% (H29当初) →100% (H31末))

7

2. 交付対象事業

○防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）
A 基幹事業
A-1 吸收源対策公園緑地事業

神戸国際港都建設計画用途地域図
PLAN FOR CONSTRUCTION OF INTERNATIONAL PORT CITY KOBE

凡例
— 区界線

北神戸田園スポーツ公園

【A-1】吸收源対策公園緑地事業

8

3. 各事業の概要

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

【A-1】吸収源対策公園緑地事業

事業者：神戸市

内 容：北神戸田園スポーツ公園における法面整備

事業実施期間：平成29年度～平成31年度

全体事業費：30百万円

9

3. 各事業の概要

吸収源対策公園緑地事業とは

事業概要

「京都議定書目標達成計画（平成20年3月改定）」に基づく地球温暖化対策の一層の推進を図るため、温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備又は公共公益施設の緑化を支援する。

事業の要件

①一箇所あたりの事業対象面積が500m²以上かつ、緑化率が80%以上であること
②原則、都市公園及び緑地として管理するもの

③以上の要件を満たし、合計5箇所以上（重点都市※における事業には適用しない）の公園及び緑地の整備・緑化を行う事業であること

※環境モデル都市等の地区計画の指定により、緑の保全・創出を積極的に行っていいる都市

10

3. 各事業の概要

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

- 公園：北神戸田園スポーツ公園
- 整備箇所：神戸市北区
- 工期：H29～H31
- 整備内容：平成29年10月の台風21号に伴う大雨により崩壊した法面の防護工および植生吹付工
- 対象面積：法面 約0.1ha
- 整備状況：法面の崩壊対策により、安全性が確保され、都市の防災性が向上した。



11

4. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）


I 定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況

- ・本整備により安全な広域防災拠点としての機能を確保できた。

II 定量的指標の達成状況

- ・北神戸田園スポーツ公園における法面防災対策の完了をもって広域防災拠点となる9公園で安全を確保することができた。

当初：88% (8/9公園)
⇒ 変更：100% (9/9公園)

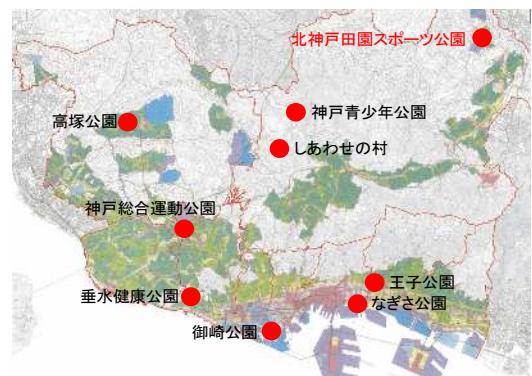

12

4. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

- ・安全な広域防災拠点としての機能を確保した結果、緊急事態以外の通常利用においても公園の安全性を確保することができた。



13

5. 特記事項（今後の方針等）

防災・安全に資する公園整備の推進（防災・安全）

- ・市民が安全に、安心して公園を防災の拠点として活用できるよう、今回整備を実施した北神戸田園スポーツ公園をはじめとして、広域防災拠点に指定されている都市公園の安全点検を継続して実施し、防災機能の向上に資する施設整備を行う。

14
